
TIME SCHEDULE

Sub Kegiatan	: Pembangunan Tanggul Sungai
Nama Pekerjaan	: Pembangunan Pengamanan Sungai Tuhad Buhu Kabupaten Karangasem
Kab./Kota	: Karangasem
Nilai Kontrak	: Rp. 1.956.500.000,00
Tahun anggaran	: 2023
Kontraktor Pelaksana	: CV. Kokak Srigathi
Konsultan Pengawas	: CV. Prema Wangun Jaya

Nomor Kontrak	: B.29.602.1/10252/SDA/PUPRKIM (Pasebat Penandatanganan Kontrak) 05/KS-SPK/VII/2023 (Penyedia)
Tanggal kontrak	: 5 JULI 2023
Nomor SPMK	: B.29.602.1/10255/SDA/PUPRKIM
Tanggal SPMK	: 6 JULI 2023

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN Rp.	JML HARGA + PPN 11% Rp.	BOBOT %	JULI 2023				AGUSTUS 2023							SEPTEMBER 2023						OKTOBER 2023					NOP. 2023		KETERANGAN
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
							6 s/d 9	10 s/d 16	17 s/d 23	24 s/d 30	31 s/d 6	7 s/d 13	14 s/d 20	21 s/d 27	28 s/d 3	4 s/d 10	11 s/d 17	18 s/d 24	25 s/d 1	2 s/d 8	9 s/d 15	16 s/d 22	23 s/d 29	30 s/d 3						
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN / PENUNJANG																													
1	Pembersihan Lapangan	Ls	1,00	1.918.703,01	2.127.540,34	0,109		0,036	0,036	0,037																				
2	Pengukuran/Uitzet Pasang Bowplank	M'	124,28	4.000,00	551.803,20	0,028		0,009	0,009	0,010																				
3	Papan Nama Kegiatan	Ls	1,00	300.000,00	333.000,00	0,017	0,017																							
4	Sewa Direksikeet	Ls	1,00	700.000,00	777.000,00	0,040	0,040																							
5	Mobilisasi dan Demobilisasi	Ls	1,00	1.000.000,00	1.110.000,00	0,057			0,029															0,028						
II.	PEKERJAAN TANAH																													
1	Pek. Galian Tanah Biasa	M3	1.650,00	86.331,00	158.115.228,50	8,082				0,622	0,622	0,622	0,622	0,622	0,622	0,622	0,622	0,622	0,622	0,622	0,622	0,622	0,618							
2	Pek. Galian Tanah Berbatu sedalam < 1 m	M3	1.328,00	37.050,00	54.614.664,00	2,791				0,215	0,215	0,215	0,215	0,215	0,215	0,215	0,215	0,215	0,215	0,215	0,215	0,215	0,211							
3	Pek. Urugan Tanah Kembali dipadatkan	M3	3.492,62	12.253,00	47.502.530,87	2,428					0,173	0,173	0,173	0,173	0,173	0,173	0,173	0,173	0,173	0,173	0,173	0,173	0,173	0,173	0,179						
III.	PEKERJAAN PASANGAN :																													
1	Pasangan batu mortar tipe O, fc' = 2,4 Mpa (setara 1 SP : 5 PP)	M3	2.795,52	506.669,00	1.572.207.688,40	80,358					0,181	1,181	2,181	3,181	4,181	5,181	6,181	7,181	8,181	9,181	10,181	11,181	12,181	13,181	13,181	10,181	4,181	2,186			
2	Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe O, fc' = 2,4 Mpa (Setara 1 PC : 5 PP)	M2	364,00	42.267,00	17.077.558,68	0,873						0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,069	
3	Siaran dgn Mortar Type M, fc' = 17,2 Mpa (Setara 1 PC : 2 PP)	M2	2.256,80	30.800,00	77.155.478,40	3,944						0,282	0,282	0,282	0,282	0,282	0,282	0,282	0,282	0,282	0,282	0,282	0,282	0,282	0,282	0,282	0,282	0,282	0,278	
4	Pasangan drain/pipa suling-suling	M'	292,00	15.952,00	5.170.362,24	0,264						0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,017	
5	Pek. Kisdam	Bh	491,67	6.790,00	3.705.667,62	0,189				0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,007		
IV.	PENYELENGGARAAN KEGIATAN SMK3																													
	Sosialisasi dan Promosi K3 terdiri atas :																													
1	Spanduk (banner);	Bh	1,00	50.000,00	55.500,00	0,003		0,003																						
2	Poster;	Bh	1,00	40.000,00	44.400,00	0,002		0,002																						
3	Papan Informasi K3	Bh	1,00	300.000,00	333.000,00	0,017		0,017																						
	Rambu-Rambu K3 terdiri atas:																													
1	Rambu Kewajiban K3	Bh	2,00	50.000,00	111.000,00	0,006		0,006																						
	Fasilitas sarana kesehatan;																													
1	Peralatan P3K (Kotak P3K, Obat Luka, Perban, dll)	Set	1,00	200.000,00	222.000,00	0,011		0,011																						
	Alat Pelindung Kerja terdiri atas:																													
1	Helm Pelindung	Bh	70,00	40.000,00	3.108.000,00	0,159		0,080	0,079																					
2	Rompi Keselamatan	Bh	70,00	25.000,00	1.942.500,00	0,099		0,050	0,049																					
3	Sepatu Keselamatan	Psng	70,00	55.000,00	4.273.500,00	0,218		0,109	0,109																					
4	Sarung Tangan	Psng	70,00	10.000,00	777.000,00	0,040		0,020	0,020																					
5	Pelindung Pernapasan (Masker)	Kotak	75,00	30.000,00	2.497.500,00	0,128		0,064	0,064																					
6	Alat Pengukur Suhu	Bh	1,00	375.000,00	416.250,00	0,021			0,021																					
7	Tempat Cuci Tangan	Bh	1,00	426.423,20	473.329,75	0,024			0,024																					
V.	ADMINISTRASI DAN DOKUMENTASI																													
1	Administrasi	Ls	1,00	869.369,37	965.000,00	0,049	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002					
2	Dokumentasi Foto dan Video	Ls	1,00	750.000,00	832.500,00	0,043	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003					
					1.956.500.000,00																									
				TOTAL		100,000																								
				RENCANA KEMAJUAN PEKERJAAN			0,062	0,412	0,445	0,903	1,511	2,679	3,578	4,578	5,578	7,578	10,578	12,679	14,679	14,679	11,579	5,570	2,767	0,548							
				KOMULATIF			0,062	0,474	0,919	1,822	3,333	5,911	9,489	14,067	19,645	27,223	37,801	50,380	64,959	79,537	91,115	96,685	99,452	100,000							
				REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN																											
				KOMULATIF																											
				DEVIASI																											

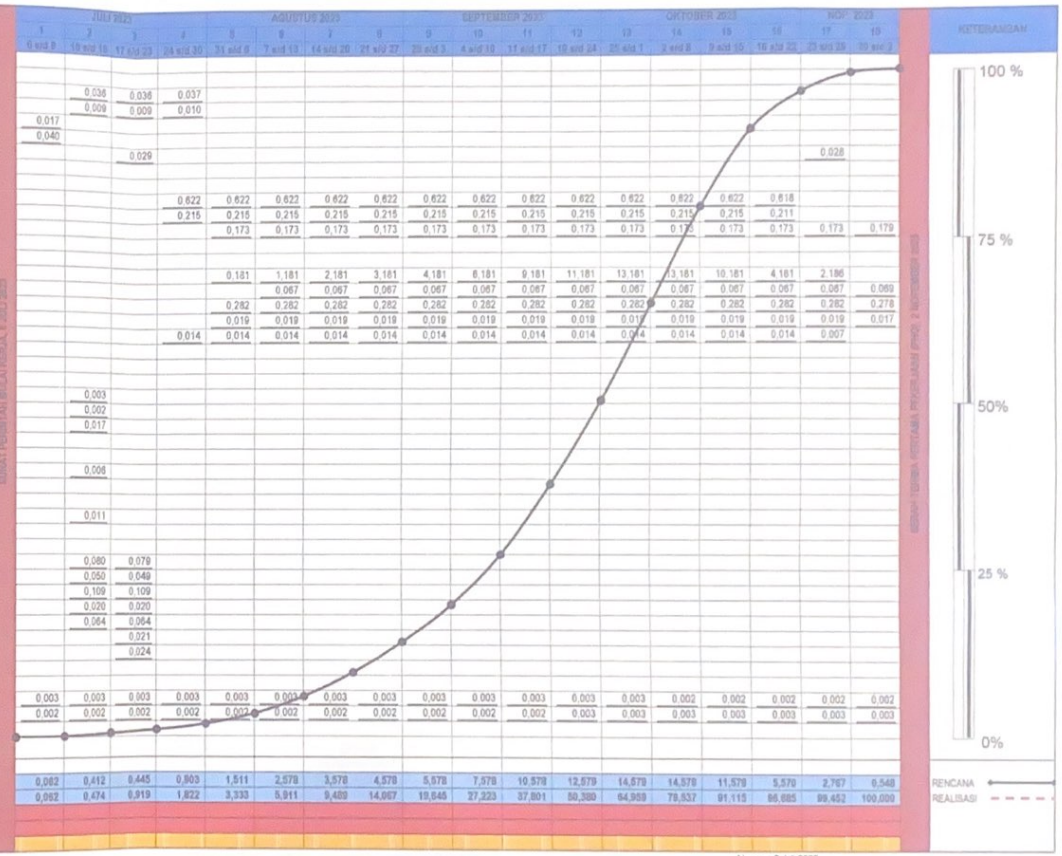

Mengetahui Oleh
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada
Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman Provinsi Bali

Ir. I Nyoman Wiarta, MT
Nip. 19660913 199903 1 004

Diperiksa Oleh
Konsultan Pengawas
CV. PREMA WANGUN JAYA

I Gusti Nourah Bagas Nurdesterna, ST
Direktur

Negara, 6 Juli 2023
Dibuat Oleh
Kontraktor Pelaksana
CV. KOKAK SRIGATHI

CV. KOKAK SRIGATHI
KONTRAKTOR & SUPPLIER

I Ketut Suparta
Direktur I
