PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
JALAN BELITON NOMOR 2 DENPASAR – (80112), TELEPON (0361) 222883,
Laman : dispuprkim.baliprov.go.id, Pos-el : puprkim@baliprov.go.id

LAPORAN KEGIATAN

MINGGU KE – XX (DUA PULUH)

PENATAAN AREA PARAHYANGAN DI KAWASAN SUCI BESAKIH DI KABUPATEN KARANGASEM TAHAP II

MSK
PT. MANIK SEKECAP KARYA

Cert. No 500143

PEMBAHASAN

01 INFORMASI PROGRESS

02 PENGENDALIAN MUTU

03 MITIGASI RISIKO

04 DOKUMENTASI



INFORMASI PROGRESS

INFORMASI PROGRESS PURA CATUR LAWA



INFORMASI PROGRESS

PROGRESS REPORT (CATUR LAWA)

MINGGU KE	:	XX (DUA PULUH)
PERIODE TGL	:	08 SEPTEMBER 2026 S/D 14 SEPTEMBER 2026
HARI KE	:	140 HARI KALENDER
SISA WAKTU	:	70 HARI KALENDER



RENCANA
56,158 %



REALISASI
52,945 %



DEVIASI
- (3,213) %

SISA PROGRESS : 47,055 %



INFORMASI PROGRESS

PROGRESS REPORT (CATUR LAWA)

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA	BOBOT ADD - I	BOBOT RENCANA	BOBOT PELAKSANAAN FISIK			PROGRES REALISASI	DEVIASI	KET.
					S / D MINGGU LALU	DALAM PEKERJAAN MINGGU INI	S / D MINGGU INI			
		(Rp.)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	
A.	**KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA**	Rp 75.501.415,080	0,170	0,170	0,168	0,000	0,168	98,545	- 0,002	BELUM
B.	**PEKERJAAN PERSIAPAN**	Rp 374.715,000	0,001	0,001	0,001	-	0,001	100,000	-	SELESAI
C.2	**PURA IDA RATU PASEK**									
C.2.1	PEKERJAAN PENATAAN HALAMAN	Rp 11.302.909.865,621	25,485	12,783	14,705	0,136	14,841	58,234	2,058	BELUM
C.2.2	PEKERJAAN WANTILAN	Rp 2.624.612.216,916	5,918	4,499	4,290	0,017	4,307	72,779	(0,192)	BELUM
C.2.3	PEKERJAAN REHABILITASI PELINGGIH	Rp 2.116.156.680,529	4,771	1,276	0,571	0,195	0,767	16,069	(0,509)	BELUM
C.2.4	PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, DAN PLUMBING	Rp 524.283.789,800	1,182	0,556	0,604	0,001	0,605	51,150	0,048	BELUM
C.3	**PURA IDA RATU PENYARIKAN**									
C.3.1	PEKERJAAN PENATAAN HALAMAN	Rp 1.895.656.324,828	4,274	4,239	4,145	0,002	4,148	97,042	(0,091)	BELUM
C.3.2	PEKERJAAN REHABILITASI PELINGGIH	Rp 1.191.650.460,429	2,687	0,882	0,706	0,137	0,844	31,395	(0,038)	BELUM
C.3.3	PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, DAN PLUMBING	Rp 160.190.870,400	0,361	0,108	0,183	0,007	0,190	52,734	0,083	BELUM
C.4	**PURA IDA RATU PANDE**									
C.4.1	PEKERJAAN PENATAAN HALAMAN	Rp 1.744.708.962,120	3,934	3,810	3,718	0,021	3,740	95,066	(0,070)	BELUM
C.4.2	PEKERJAAN TOILET, GUDANG DAN BALE PESANDEKAN	Rp 1.137.144.697,336	2,564	0,790	1,107	0,067	1,174	45,775	0,384	BELUM
C.4.3	PEKERJAAN REHABILITASI PELINGGIH	Rp 1.075.562.718,835	2,425	0,320	0,502	-	0,502	20,719	0,183	BELUM
C.4.4	PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, DAN PLUMBING	Rp 449.661.605,800	1,014	0,339	0,441	-	0,441	43,544	0,102	BELUM

INFORMASI PROGRESS

PROGRESS REPORT (CATUR LAWA)


D	**PURA IDA RATU DUKUH**							-		#DIV/0!	-	
D.1	NISTA MANDALA	Rp	4.096.601.584,994	9,237	8,534	5,345	0,307	5,652	61,195	(2,881)	BELUM
D.2	MADYA MANDALA	Rp	2.575.244.579,032	5,806	4,815	3,578	0,264	3,842	66,170	(0,973)	BELUM
D.3	UTAMA MANDALA	Rp	1.988.494.965,736	4,484	4,484	3,315	0,010	3,325	74,159	(1,159)	BELUM
D.4	MARGI MPURWA DAKSINA	Rp	1.104.060.516,264	2,489	0,404	0,614	0,002	0,615	24,710	0,211	BELUM
D.5	JABA SISI	Rp	1.606.842.702,670	3,623	1,714	0,494	0,164	0,658	18,161	(1,056)	BELUM
D.7	PENGAYENG SEGARA	Rp	203.473.974,184	0,459	-	0,286	-	0,286	62,352	0,286	BELUM
D.8	PURA RATU DUKUH (RATU GEDE)	Rp	1.225.088.025,353	2,762	0,149	0,684	0,002	0,686	24,840	0,537	BELUM
D.9	PURA PEMELASTIAN	Rp	873.200.236,993	1,969	0,180	0,257	0,024	0,282	14,308	0,101	BELUM
D.10	PURA DUKUH (RATU NIANG)	Rp	747.501.912,705	1,685	0,112	0,503	0,005	0,508	30,169	0,397	BELUM
D.11	PEKERJAAN MEP AREA PURA RATU DUKUH	Rp	847.031.756,571	1,910	0,477	0,666	0,004	0,671	35,115	0,194	BELUM
							-		#DIV/0!	-	
C.5	**PURA IDA RATU DUKUH PESIMPENAN**						-		#DIV/0!	-	
C.5.1	PEKERJAAN PENATAAN HALAMAN	Rp	1.476.529.852,080	3,329	2,846	2,498	0,003	2,500	75,106	(0,345)	BELUM
C.5.2	PEKERJAAN DAPUR DAN TOILET	Rp	458.202.672,100	1,033	0,044	0,024	-	0,024	2,334	(0,020)	BELUM
C.5.3	PEKERJAAN REHABILITASI PELINGGIH	Rp	2.154.053.929,143	4,857	1,992	1,237	0,231	1,468	30,227	(0,524)	BELUM
C.5.4	PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, DAN PLUMBING	Rp	696.545.456,200	1,571	0,636	0,697	0,002	0,700	44,554	0,064	BELUM
TOTAL		**Rp**	**44.351.286.486,717**	**100,000**	**56,158**	**51,340**	**1,604**	**52,945**		**- 3,213**	**BELUM**

PPN 11%	**Rp**	**4.878.641.513,539**	**KOMULATIF REALISASI PROGRES SAMPAI DENGAN MINGGU INI**	**52,945**	**%**
JUMLAH	**Rp**	**49.229.928.000,256**	**KOMULATIF RENCANA PROGRES SAMPAI DENGAN MINGGU INI**	**56,158**	**%**
DIBULATKAN	**Rp**	**49.229.928.000,000**	**DEVIASI**	**- 3,213**	**%**

INFORMASI PROGRESS GENERAL

PROGRESS REPORT GRAFIK MINGGUAN (CATUR LAWA)

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT ADD - I	PELAKSANAAN PEKERJAAN 210 (DUA RATUS SEPULUH) HARI KALENDER																													KET.
			BULAN I				BULAN II				BULAN III				BULAN IV					BULAN V					BULAN VI				BULAN VII					
			M1	M2	MC - 0	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	ADD - I	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28	M29	M30	
		(%)	28 - 04	05 - 11		26 - 01	02 - 08	09 - 15	16 - 22	23 - 29	30 - 06	07 - 13	14 - 20	21 - 27	28 - 03	04 - 10	11 - 17	18 - 24	25 - 31		22 - 28	29 - 05	06 - 12	13 - 19	20 - 26	27 - 02	03 - 09	10 - 16	17 - 23	24 - 30	01 - 07	08 - 14	15 - 21	22 - 28	
A.	KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA	0,170	0,094	0,069		0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B.	PEKERJAAN PERSIAPAN	0,001	-	0,001		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C.2	PURA IDA RATU PASEK																																	
C.2.1	PEKERJAAN PENATAAN HALAMAN	25,485	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,004	0,379	0,621	1,137	1,893		5,215	1,430	1,430	1,837	1,431	1,605	1,498	1,559	1,140	1,140	1,150	1,169	1,005	1,005	
C.2.2	PEKERJAAN WANTILAN	5,918	-	-		0,003	0,008	0,014	0,067	0,308	0,126	0,261	0,511	0,335	0,235	0,125	0,925	0,925	0,259		1,259	0,224	0,144	0,098	0,182	0,168	0,137	0,237	0,232	0,116	0,1	0,109	0,063	-	
C.2.3	PEKERJAAN REHABILITASI PELINGGIH	4,771	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,025	0,133	0,160	0,906		0,004	0,245	0,302	0,256	0,361	0,721	0,861	0,310	0,545	0,342	0,095	0,147	0,069	0,044	
C.2.4	PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, DAN PLUMBING	1,182	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,051	0,096	0,389	0,328	0,318		-	-	-	-	-	-	-	-	0,051	0,244	0,223	0,099	0,110	0,099	
C.3	PURA IDA RATU PENYARIKAN																																	
C.3.1	PEKERJAAN PENATAAN HALAMAN	4,274	-	-		-	-	0,025	0,003	0,189	0,259	0,093	0,439	0,457	0,634	0,634	0,634	0,657	0,101		0,073	0,055	0,043	0,014	0,019	0,005	0,003	0,0	-	-	-	-	0,005	-	
C.3.2	PEKERJAAN REHABILITASI PELINGGIH	2,687	-	-		-	-	-	-	0,018	0,395	0,551	0,686	0,549	0,256	0,160	0,060	-	-		0,050	0,220	0,173	0,051	0,040	0,036	0,049	0,204	0,591	0,438	0,218	0,141	0,067	0,021	
C.3.3	PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, DAN PLUMBING	0,361	-	-		-	-	-	-	-	-	0,317	0,012	0,032	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	0,006	-	0,128	0,040	0,040	0,040	
C.4	PURA IDA RATU PANDE																																	
C.4.1	PEKERJAAN PENATAAN HALAMAN	3,934	-	-		-	-	-	-	0,071	0,017	0,085	0,064	0,460	0,262	0,229	0,308	0,308	0,308		0,156	-	-	-	0,01	0,012	0,007	0,008	0,005	0,021	0,034	0,016	0,005	0,002	
C.4.2	PEKERJAAN TOILET, GUDANG DAN BALE PESANDEKAN	2,564	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,221	0,197	0,170	0,155		0,098	0,220	0,275	0,197	0,136	0,209	0,208	0,169	0,127	0,168	0,264	0,156	0,190	0,148	
C.4.3	PEKERJAAN REHABILITASI PELINGGIH	2,425	-	-		-	-	-	-	-	-	0,113	0,533	-	0,301	0,555	0,398	0,257	0,040		-	-	-	-	-	-	0,113	0,646	-	0,211	0,512	0,312	0,257	0,055	
C.4.4	PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, DAN PLUMBING	1,014	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,160	0,381	0,297	0,058	0,118		-	-	-	-	-	-	-	-	0,006	0,037	0,230	0,197	0,060	0,145	
D	PURA IDA RATU DUKUH																																	
D.1	NISTA MANDALA	9,237	-	-		-	0,030	0,035	0,043	0,201	0,274	0,044	0,144	0,210	0,401	0,620	0,374	0,535	0,772		1,354	0,643	1,069	0,463	0,341	0,111	0,151	0,038	0,062	-	-	-	-	-	
D.2	MADYA MANDALA	5,806	-	-		-	-	-	0,007	0,015	0,060	0,197	0,119	0,193	0,079	0,175	0,496	0,707	0,632		0,81	0,560	0,030	0,030	0,030	-	-	0,148	0,117	0,123	0,229	0,135	0,177	0,032	
D.3	UTAMA MANDALA	4,484	-	-		-	-	-	-	0,001	-	0,005	0,004	0,065	0,055	0,072	0,107	0,124	0,882		0,02	0,643	0,635	0,090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D.4	MARGI MPURWA DAKSINA	2,489	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,054	0,029	0,466	0,017	0,017		-	-	-	-	-	-	-	0,247	0,152	0,298	0,298	0,309	0,390	0,390	
D.5	JABA SISI	3,623	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	0,001	0,073	0,035	0,014	0,146	0,08		0,225	0,138	0,478	0,868	0,335	0,232	0,186	0,375	0,328	0,165	0,109	0,035	0,023	0,122	
D.7	PENGAYENG SEGARA	0,459	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,082	-	-	0,002		-	-	-	-	0,192	0,136	0,131	-	-	-	-	-	-	
D.8	PURA RATU DUKUH (RATU GEDE)	2,762	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,041	-	-	0,001	0,007		-	-	-	-	0,285	0,224	0,075	0,069	0,091	0,338	0,271	0,615	0,433	0,211	
D.9	PURA PEMELASTIAN	1,969	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	0,002	-	0,019	0,008	0,028	0,089		-	-	-	-	-	0,320	0,297	0,428	0,502	0,241	-	-	-	-	
D.10	PURA DUKUH (RATU NIANG)	1,685	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,001		-	-	-	-	-	-	-	0,035	0,176	0,348	0,402	0,378	0,117	0,117	
D.11	PEKERJAAN MEP AREA PURA RATU DUKUH	1,910	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,009		-	-	-	-	0,009	0,010	0,118	0,091	0,144	0,185	0,284	0,380	0,212	-	
C.5	PURA IDA RATU DUKUH PESIMPENAN																																	
C.5.1	PEKERJAAN PENATAAN HALAMAN	3,329	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	0,020	-	-	-	0,104	0,104		0,142	0,088	0,088	0,118	0,194	0,127	0,060	0,051	0,051	-	-	-	-	-	
C.5.2	PEKERJAAN DAPUR DAN TOILET	1,033	-	-		-	-	-	-	0,010	0,005	0,020	0,001	0,007	0,047	0,067	0,053	0,082	0,269		-	-	-	0,044	0,178	0,053	0,145	0,056	0,179	0,186	0,068	0,083	0,042	-	
C.5.3	PEKERJAAN REHABILITASI PELINGGIH	4,857	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,009	0,074	0,074	-	0,012		-	0,093	0,058	0,780	0,976	0,782	0,752	0,016	0,095	0,242	-	-	-	-	
C.5.4	PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, DAN PLUMBING	1,571	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	0,016	-	0,038	0,111	0,103	0,058	0,238	0,371	-	
	JUMLAH	100,00																																
	PROGRES RENCANA MINGGUAN		0,094	0,036		0,003	0,038	0,075	0,120	0,806	1,136	1,922	1,437	3,534	2,795	3,781	5,287	5,792	7,085		9,401	4,659	4,726	4,847	4,724	4,766	4,792	4,729	4,712	4,747	4,748	4,559	3,634	2,430	
	KOMULATIF		0,094	0,130		0,134	0,173	0,247	0,367	1,173	2,309	4,231	5,668	9,202	11,997	15,777	21,065	26,857	33,942		41,926	46,585	51,311	56,158	60,882	65,648	70,440	75,169	79,882	84,629	89,377	93,936	97,570	100,00	
	PROGRES REALISASI MINGGUAN		0,135	0,030		0,038	0,037	0,296	0,721	0,485	1,620	0,938	1,619	3,317	2,832	3,734	5,318	5,765	7,104		7,977	4,633	4,741	1,604											
	KOMULATIF		0,135	0,165		0,203	0,241	0,536	1,257	1,742	3,362	4,300	5,919	9,236	12,068	15,802	21,120	26,885	33,989		41,966	46,599	51,340	52,945											
	DEVIASI		0,041	0,035		0,069	0,068	0,289	0,890	0,569	1,053	0,069	0,251	0,034	0,071	0,025	0,055	0,028	0,047		0,039	0,014	0,030	(3,213)											



KETERANGAN :

RENCANA


REALISASI

PENGENDALIAN MUTU

PENGENDALIAN MUTU
JOINT INSPECTION





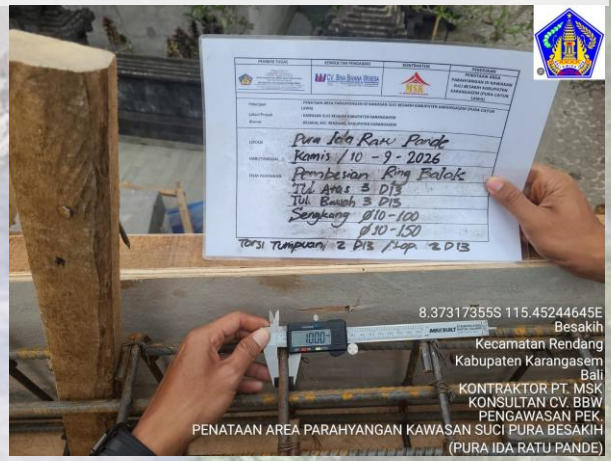








PENGENDALIAN MUTU
JOINT INSPECTION

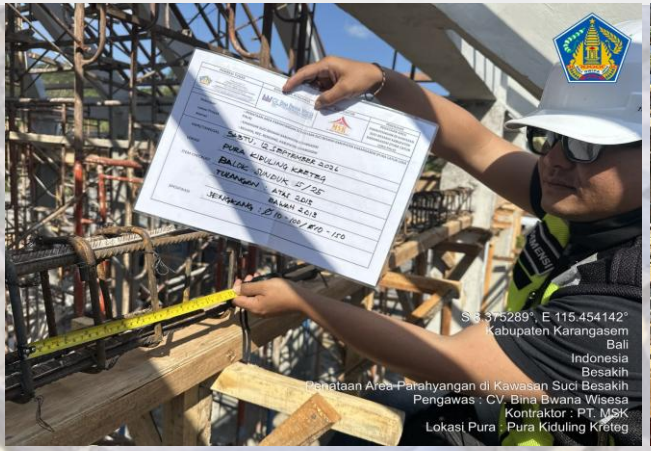












PENGENDALIAN MUTU
SLUMP TEST




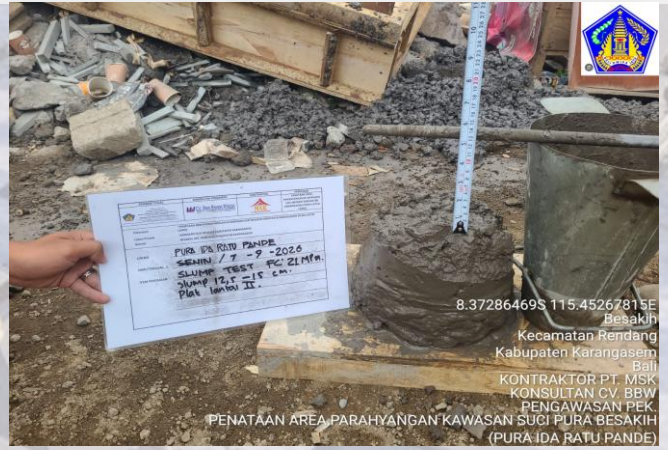







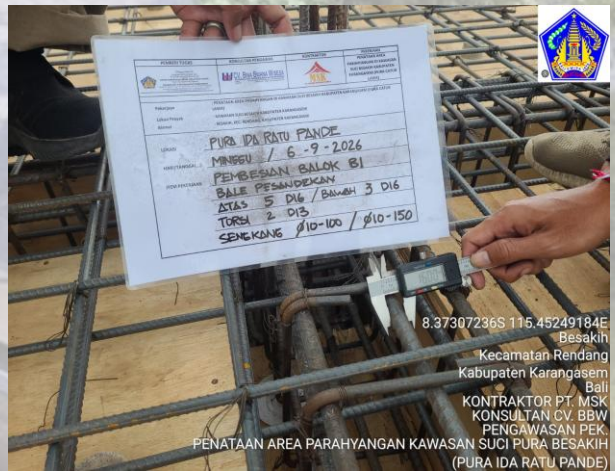

PENGENDALIAN MUTU
SLUMP TEST





MITIGASI RISIKO

MITIGASI RISIKO

NO	SUMBER RISIKO	RISIKO DOMINAN	MITIGASI RISIKO	PIC	TARGET	STATUS	
						OPEN	CLOSE
1	Penerapan K3	• Penggunaan APD tenaga kerja	• Tenaga kerja wajib menggunakan APD saat bekerja maupun saat berada di area proyek	Kontraktor		√	
		• Sampah konstruksi dan bekas bungkus makanan dan aminuman area kerja	• Pembuangan secara berkala dan membuat tempat sampah yang ditempatkan beberapa titik area kerja	Kontraktor	Berkala	√	
2	Pek. Struktur	• Pekerjaan Pembesian	• Gunakan metode rebar prefabrikasi (pembesian pra-fabrikasi) di area khusus di luar lokasi rawan untuk meminimalkan durasi perakitan di titik berbahaya	Kontraktor		√	
		• Pekerjaan Struktur Atap	• Gunakan metode Job Safety Analysis (JSA) untuk menjelaskan tahapan kerja dan potensi bahaya spesifik	Kontraktor		√	
		• Pekerjaan Beton	• Pastikan proporsi campuran beton telah melalui perhitungan teknis yang tepat untuk menghindari beton keropos atau gagal mencapai	Kontraktor		√	
		• Pekerjaan Pasangan Dinding	• Pastikan pemasangan scaffolding dilakukan oleh tenaga kerja propesional, gunakan papan pijakan yang kuat, dan wajibkan penggunaan body harness yang dikaitkan pada titik kokoh	Kontraktor		√	
3	Pek. Arsitektur	• Pekerjaan Kayu	• Mesin penghalus, gergaji, dan pemotong kayu memiliki tingkat risiko ekstrem (extreme risk) terhadap cedera fisik atau amputasi Analisis Risiko K3 Dengan Pendekatan HIRARC	Kontraktor		√	
		• Pekerjaan Pasangan Tempelan Style Bali Batu Tabas Ex Karangasem	• Gunakan adukan (spesi) semen dan pasir dengan perbandingan 1:3 atau 1:4, dan biarkan fondasi kering secara merata minimal 7 hari sebelum diberi beban berat.	Kontraktor		√	
			• Lakukan koordinasi lapangan (site koordinasi) yang baik, dan buat area lay down (penyimpanan material) sementara yang rapi agar tidak mengganggu akses warga sekitar				
			• Wajib menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker debu dan kaca mata pelindung (safety goggles).				
		• Pekerjaan Ukiran Kayu	• Waktu Pelaksanaan	For Info		√	
4	Administrasi	• Joint Inspection	• Belum ada pengajuan Berita acara Joint Inspection	Kontraktor		√	

DOKUMENTASI PROGRESS



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
JALAN BELITON NOMOR 2 DENPASAR – (80112), TELEPON (0361) 222883.
Laman : dispuprkim.baliprov.go.id, Pos-el : puprkim@baliprov.go.id

PT. MANIK SEKECAP KARYA

DOKUMENTASI PROGRESS

(CATUR LAWA)

PT. MANIK SEKECAP KARYA

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
JALAN BELITON NOMOR 2 DENPASAR – (80112), TELEPON (0361) 222883,
Laman : dispuprkim.baliprov.go.id, Pos-el : puprkim@baliprov.go.id

PT. MANIK SEKECAP KARYA

DOKUMENTASI PROGRESS DI PURA IDA RATU PENYARIKAN












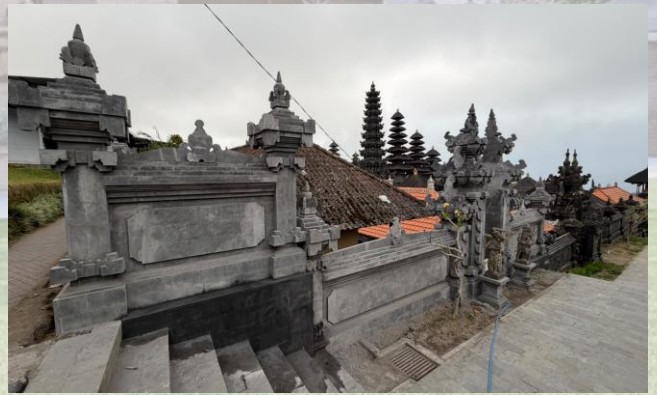

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
JALAN BELITON NOMOR 2 DENPASAR – (80112), TELEPON (0361) 222883,
Laman : dispuprkim.baliprov.go.id, Pos-el : puprkim@baliprov.go.id

PT. MANIK SEKECAP KARYA

DOKUMENTASI PROGRESS DI PURA IDA RATU DUKUH








PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
JALAN BELITON NOMOR 2 DENPASAR – (80112), TELEPON (0361) 222883,
Laman : dispuprkim.baliprov.go.id, Pos-el : puprkim@baliprov.go.id

PT. MANIK SEKECAP KARYA

DOKUMENTASI PROGRESS DI PURA IDA RATU PASEK








PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
JALAN BELITON NOMOR 2 DENPASAR – (80112), TELEPON (0361) 222883,
Laman : dispuprkim.baliprov.go.id, Pos-el : puprkim@baliprov.go.id

PT. MANIK SEKECAP KARYA

DOKUMENTASI PROGRESS DI PURA IDA RATU PANDE













ᬩᬮᬶᬦᬕᬭᬸᬧᬩᬭᬶᬲᬸᬫᬸ ᬦᬱᬶ
PEMERINTAH PROVINSI BALI
ᬤᬶᬦᬲᬶ ᬩᬶᬓᬶᬢᬸᬯᬓᬶ ᬓᬸᬬᬶᬃ ᬩᬓᬢᬓᬶ ᬬᬩᬶ
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
ᬩᬸᬬᬳᬢᬓᬶ ᬲᬓᬶᬢᬶᬓᬩᬮᬓᬶ ᬩᬸᬬᬫᬶᬬᬓᬶ
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
ᬦᬩᬓᬶ ᬦᬶᬫᬶᬬᬸᬦᬓᬶ ᬳᬢᬸᬬᬸᬂ ᬬᬸᬓᬸ ᬳᬢᬸᬬᬸᬂ (ᬯᬩᬦᬶᬲᬶᬫ) ᬬᬸᬓᬸᬬᬸᬫᬓᬶ (ᬯᬩᬦᬶᬲᬶᬫ) ᬬᬸᬓᬸᬩᬸᬩᬸᬂ
JALAN BELITON NOMOR 2 DENPASAR – (80112), TELEPON (0361) 222883,
Laman : dispuprkim.baliprov.go.id, Pos-el : puprkim@baliprov.go.id

MSK
PT. MANIK SEKECAP KARYA

DOKUMENTASI PROGRESS DI PURA IDA RATU DUKUH PESIMPANAN



