PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
JALAN BELITON NOMOR 2 DENPASAR – (80112), TELEPON (0361) 222883,
Laman : dispuprkim.baliprov.go.id, Pos-el : puprkim@baliprov.go.id

LAPORAN KEGIATAN

MINGGU KE – XX (DUA PULUH)

PENATAAN AREA PARAHYANGAN DI KAWASAN SUCI BESAKIH DI KABUPATEN KARANGASEM TAHAP II

MSK
PT. MANIK SEKECAP KARYA

Cert. No 500143

PEMBAHASAN

01 INFORMASI PROGRESS

02 PENGENDALIAN MUTU

03 MITIGASI RISIKO

04 DOKUMENTASI



INFORMASI PROGRESS

INFORMASI PROGRESS PURA CATUR LOKA PALA



INFORMASI PROGRESS

PROGRESS REPORT (CATUR LOKA PALA)

MINGGU KE	:	XX (DUA PULUH)
PERIODE TGL	:	08 SEPTEMBER 2026 S/D 14 SEPTEMBER 2026
HARI KE	:	140 HARI KALENDER
SISA WAKTU	:	70 HARI KALENDER



RENCANA
57,719 %



REALISASI
55,492 %



DEVIASI
- (2,226) %

SISA PROGRESS : 44,508 %



INFORMASI PROGRESS

PROGRESS REPORT (CATUR LOKA PALA)

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA	BOBOT ADD - I	BOBOT RENCANA	BOBOT PELAKSANAAN FISIK PEKERJAAN DALAM			PROGRES REALISASI	DEVIASI	KET.
					S / D MINGGU LALU	MINGGU INI	S / D MINGGU INI			
		(Rp.)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	
A	ZONA 1 (PURA CATUR LOKA PALA)									
	A.1 KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA	Rp 77.181.123,630	0,157	0,155	0,155	0,000	0,155	98,818	0,000	BELUM
	A.2 PURA GELAP					-		#DIV/0!	-	
	A.2.1 PEKERJAAN PENATAAN HALAMAN	Rp 3.563.776.111,113	7,244	1,362	1,741	0,227	1,968	27,168	0,606	BELUM
	A.2.2 PEKERJAAN REHABILITASI PELINGGIH	Rp 6.772.484.343,455	13,767	5,296	4,114	0,251	4,365	31,707	- 0,931	BELUM
	A.2.3 PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, DAN PLUMBING	Rp 737.692.460,530	1,500	0,013	0,696	0,040	0,736	49,057	0,722	BELUM
						-		#DIV/0!	-	
	A.3 PURA KIDULING KRETEG					-		#DIV/0!	-	
	A.3.1 PEKERJAAN PENATAAN HALAMAN	Rp 8.360.679.156,161	16,995	13,152	11,096	0,914	12,010	70,669	- 1,142	BELUM
	A.3.2 PEKERJAAN WANTILAN	Rp 2.781.618.751,486	5,654	2,937	2,701	0,163	2,864	50,645	- 0,073	BELUM
	A.3.3 PEKERJAAN REHABILITASI PELINGGIH	Rp 4.802.614.005,449	9,762	4,523	5,178	0,595	5,772	59,129	1,249	BELUM
	A.3.4 PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, DAN PLUMBING	Rp 852.503.464,860	1,733	0,088	0,785	0,051	0,836	48,259	0,749	BELUM

INFORMASI PROGRESS

PROGRESS REPORT (CATUR LOKA PALA)

	A.4 PURA ULUN KUL-KUL							-	#DIV/0!	-	
	A.4.1 PEKERJAAN PENATAAN HALAMAN	Rp	2.657.100.423,475	5,401	3,963	4,026	-	4,026	74,542	0,063	BELUM
	A.4.2 PEKERJAAN TOILET DAN GENAH NGASTAWA	Rp	509.097.130,226	1,035	0,141	-	-	-	-	- 0,141	BELUM
	A.4.3 PEKERJAAN REHABILITASI PELINGGIH	Rp	3.139.372.949,705	6,381	4,398	2,426	-	2,426	38,023	- 1,972	BELUM
	A.4.4 PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, DAN PLUMBING	Rp	404.221.813,930	0,822	0,083	0,279	-	0,279	33,998	0,197	BELUM
							-		#DIV/0!	-	
	A.5 PURA BATU MADEG						-		#DIV/0!	-	
	A.5.1 PEKERJAAN PENATAAN HALAMAN	Rp	6.056.530.504,228	12,311	11,819	11,204	0,036	11,240	91,300	- 0,579	BELUM
	A.5.2 PEKERJAAN BALE PESANDEKAN DAN BALE BANTEN	Rp	976.178.942,815	1,984	1,464	0,561	-	0,561	28,267	- 0,903	BELUM
	A.5.3 PEKERJAAN REHABILITASI PELINGGIH	Rp	7.083.815.378,224	14,399	8,290	7,529	0,276	7,804	54,200	- 0,486	BELUM
	A.5.4 PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, DAN PLUMBING	Rp	420.221.729,000	0,854	0,035	0,424	0,024	0,449	52,543	0,413	BELUM
TOTAL		**Rp**	**49.195.088.288,286**	**100,000**	**57,719**	**52,917**	**2,576**	**55,492**		**- 2,226**	**BELUM**

PPN 11%	**Rp**	**5.411.459.711,711**	**KOMULATIF REALISASI PROGRES SAMPAI DENGAN MINGGU INI**	**55,492**	**%**
JUMLAH	**Rp**	**54.606.547.999,998**	**KOMULATIF RENCANA PROGRES SAMPAI DENGAN MINGGU INI**	**57,719**	**%**
DIBULATKAN	**Rp**	**54.606.548.000,000**	**DEVIASI**	**- 2,226**	**%**

INFORMASI PROGRESS GENERAL

PROGRESS REPORT GRAFIK MINGGUAN (CATUR LOKA PALA)

NO.	URAIAN	BOBOT ADD - 1	BULAN I				BULAN II				BULAN III				BULAN IV				BULAN V					BULAN VI				BULAN VII					KET.
			M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28	M29	M30	
		(%)	28 - 04	05 - 11	12 - 18	19 - 25	26 - 01	02 - 08	09 - 15	16 - 22	23 - 29	30 - 06	07 - 13	14 - 20	21 - 27	28 - 03	04 - 10	11 - 17	18 - 24	25 - 31	01 - 07	08 - 14	15 - 21	22 - 28	29 - 05	06 - 12	13 - 19	20 - 26	27 - 02	03 - 09	10 - 16	17 - 23	
A	ZONA 1 (PURA CATUR LOKA PALA)																																
	A.1 KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA	0,157	0,075	0,024	0,021	0,029	0,016	0,006	0,006	0,006	0,027	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	A.2 PURA GELAP																																
	A.2.1 PEKERJAAN PENATAAN HALAMAN	7,244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,049	0,054	0,109	0,262	0,293	0,350	0,741	0,707	0,662	0,662	0,662	0,632	0,632	0,548	
	A.2.2 PEKERJAAN REHABILITASI PELINGGIH	13,767	-	-	-	-	0,058	0,407	0,768	1,147	0,696	0,747	0,829	0,810	1,665	1,379	0,958	0,151	0,272	0,528	1,015	0,916	2,007	1,978	1,189	1,223	0,810	0,725	0,[illegible]	0,236	0,028	0,075	
	A.2.3 PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, DAN PLUMB	1,500	-	-	-	-	-	0,002	0,018	0,586	0,586	0,599	0,619	0,030	0,016	0,016	0,012	-	-	-	-	0,002	0,017	0,012	0,174	0,186	0,206	[illegible]	0,178	0,178	0,173	0,173	
	A.3 PURA KIDULING KRETEG																																
	A.3.1 PEKERJAAN PENATAAN HALAMAN	16,995	-	-	0,016	0,116	0,313	0,223	1,069	0,891	1,231	1,173	0,896	0,884	0,882	0,989	1,001	0,959	0,892	0,944	1,188	1,172	0,462	0,452	[illegible]	0,363	0,323	0,332	0,375	0,367	0,367	0,367	
	A.3.2 PEKERJAAN WANTILAN	5,654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,017	0,072	0,064	0,087	0,164	0,392	0,886	0,044	0,259	0,320	0,292	0,479	[illegible]	0,353	0,329	0,319	0,223	0,328	0,164	0,056	-	
	A.3.3 PEKERJAAN REHABILITASI PELINGGIH	9,762	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,043	0,037	1,270	0,777	0,318	0,422	0,575	0,248	0,244	0,296	0,370	[illegible]	0,834	0,722	0,693	1,357	0,655	0,280	0,064	0,016	-	
	A.3.4 PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, DAN PLUMB	1,733	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,052	0,062	-	-	-	-	[illegible]	0,030	0,013	0,174	0,193	0,244	0,248	0,187	0,197	0,180	0,180	
	A.4 PURA ULUN KUL-KUL																																
	A.4.1 PEKERJAAN PENATAAN HALAMAN	5,401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,022	0,065	0,372	0,376	0,241	0,525	0,075	0,102	[illegible]	0,090	0,265	0,246	0,226	0,399	0,384	0,243	0,023	0,071	0,047	0,047	-	-	
	A.4.2 PEKERJAAN TOILET DAN GENAH NGASTAWA	1,035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,022	0,195	0,074	-	0,016	0,051	0,045	0,029	0,133	0,054	0,047	0,265	0,115	0,106	0,117	0,057	-	-	
	A.4.3 PEKERJAAN REHABILITASI PELINGGIH	6,381	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,020	0,219	0,62[illegible]	[illegible]009	0,083	0,655	0,910	1,057	0,496	0,182	0,332	0,448	0,368	0,156	-	-	-	-	
	A.4.4 PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, DAN PLUMB	0,822	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,048	0,435	0,464	-	-	-	-	0,035	0,109	0,037	0,062	0,066	0,104	0,120	0,063	0,063	0,058	0,058	
	A.5 PURA BATU MADEG																																
	A.5.1 PEKERJAAN PENATAAN HALAMAN	12,311	-	-	-	-	0,092	0,147	-	-	0,016	0,066	-	-	0,656	0,860	0,865	0,253	0,958	0,596	0,352	0,348	-	-	0,065	0,041	-	0,008	0,093	0,093	0,137	0,054	
	A.5.2 PEKERJAAN BALE PESANDEKAN DAN BALE BANTEN	1,984	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,069	0,481	0,241	0,432	0,320	0,345	0,046	0,010	-	0,044	0,057	-	-	0,124	0,222	0,031	0,043		
	A.5.3 PEKERJAAN REHABILITASI PELINGGIH	14,399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,166	0,852	0,500	0,301	1,374	1,818	1,124	0,330	0,053	0,023	-	0,110	-	0,218	1,142	0,950	1,585	1,572	0,510	
	A.5.4 PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, DAN PLUMB	0,854	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,002	0,004	-	-	-	-	-	0,225	0,204	0,193	0,193	
	JUMLAH	100,00																															
	PROGRES RENCANA MINGGUAN		0,075	0,024	0,037	0,145	0,478	0,785	1,861	2,631	2,557	2,673	2,524	3,615	5,475	5,856	5,957	4,720	4,803	4,891	4,878	4,805	4,895	4,822	4,845	4,755	4,750	4,760	3,929	3,910	3,457	2,158	
	KOMULATIF		0,075	0,099	0,137	0,307	0,785	1,570	3,431	6,062	8,618	11,292	13,815	17,430	22,906	28,762	34,718	38,341	43,144	48,036	52,913	57,719	62,614	67,435	72,280	77,035	81,786	86,546	90,475	94,385	97,842	100,00	
	PROGRES REALISASI MINGGUAN		0,081	0,021	0,060	0,151	0,505	0,818	1,986	2,484	2,617	2,623	2,529	3,967	5,112	7,632	4,245	3,993	4,343	4,888	4,863	2,576											
	KOMULATIF		0,081	0,102	0,162	0,313	0,818	1,636	3,622	6,106	8,723	11,346	13,874	17,841	22,953	30,585	34,829	38,822	43,166	48,054	52,917	55,492											
	DEVIASI		0,006	0,003	0,025	0,006	0,033	0,066	0,191	0,044	0,105	0,054	0,059	0,411	0,047	1,823	0,111	0,481	0,022	0,019	0,003	(2,226)											

MC - 0

ADDENDUM - I

KETERANGAN :

RENCANA


REALISASI

PENGENDALIAN MUTU

PENGENDALIAN MUTU
JOINT INSPECTION





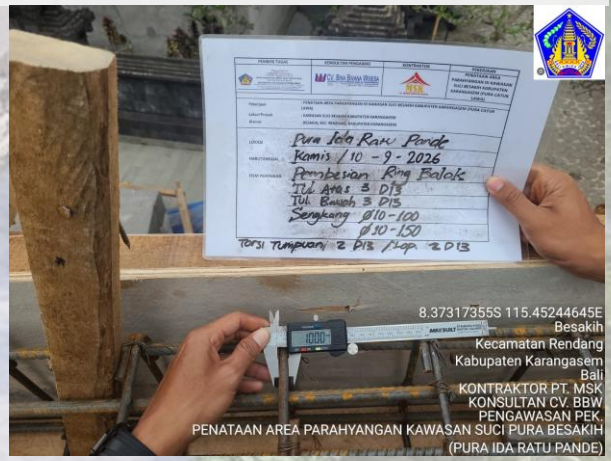








PENGENDALIAN MUTU
JOINT INSPECTION

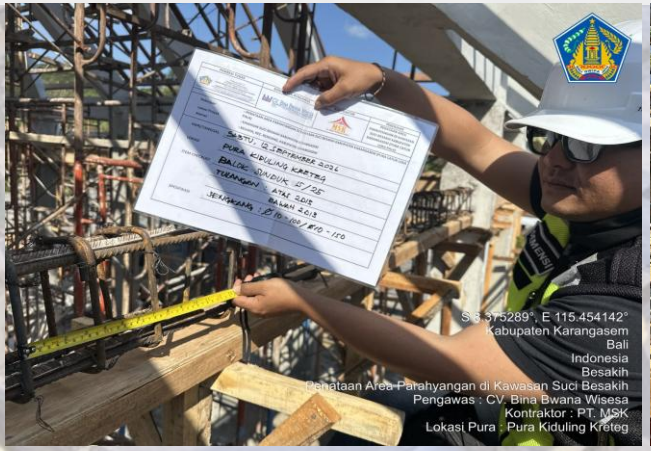












PENGENDALIAN MUTU
SLUMP TEST




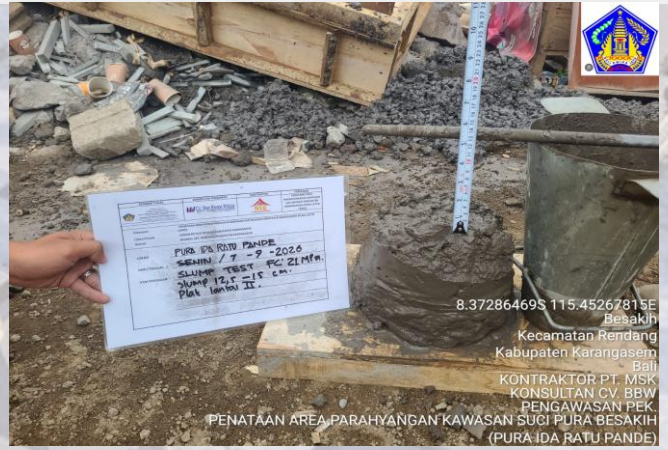







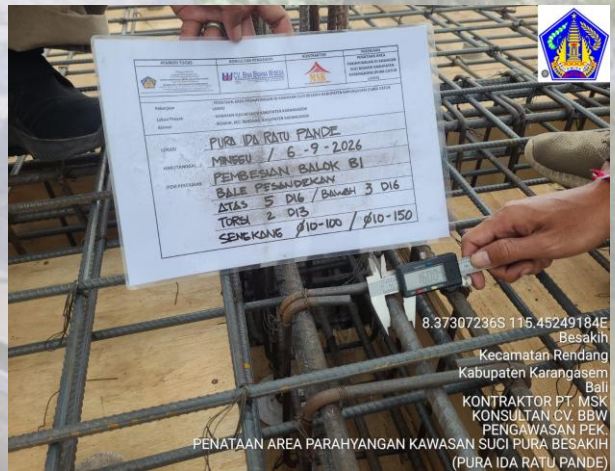

PENGENDALIAN MUTU
SLUMP TEST





MITIGASI RISIKO

MITIGASI RISIKO

NO	SUMBER RISIKO	RISIKO DOMINAN	MITIGASI RISIKO	PIC	TARGET	STATUS	
						OPEN	CLOSE
1	Penerapan K3	• Penggunaan APD tenaga kerja	• Tenaga kerja wajib menggunakan APD saat bekerja maupun saat berada di area proyek	Kontraktor		√	
		• Sampah konstruksi dan bekas bungkus makanan dan aminuman area kerja	• Pembuangan secara berkala dan membuat tempat sampah yang ditempatkan beberapa titik area kerja	Kontraktor	Berkala	√	
2	Pek. Struktur	• Pekerjaan Pembesian	• Gunakan metode rebar prefabrikasi (pembesian pra-fabrikasi) di area khusus di luar lokasi rawan untuk meminimalkan durasi perakitan di titik berbahaya	Kontraktor		√	
		• Pekerjaan Struktur Atap	• Gunakan metode Job Safety Analysis (JSA) untuk menjelaskan tahapan kerja dan potensi bahaya spesifik	Kontraktor		√	
		• Pekerjaan Beton	• Pastikan proporsi campuran beton telah melalui perhitungan teknis yang tepat untuk menghindari beton keropos atau gagal mencapai	Kontraktor		√	
		• Pekerjaan Pasangan Dinding	• Pastikan pemasangan scaffolding dilakukan oleh tenaga kerja propesional, gunakan papan pijakan yang kuat, dan wajibkan penggunaan body harness yang dikaitkan pada titik kokoh	Kontraktor		√	
3	Pek. Arsitektur	• Pekerjaan Kayu	• Mesin penghalus, gergaji, dan pemotong kayu memiliki tingkat risiko ekstrem (extreme risk) terhadap cedera fisik atau amputasi Analisis Risiko K3 Dengan Pendekatan HIRARC	Kontraktor		√	
		• Pekerjaan Pasangan Tempelan Style Bali Batu Tabas Ex Karangasem	• Gunakan adukan (spesi) semen dan pasir dengan perbandingan 1:3 atau 1:4, dan biarkan fondasi kering secara merata minimal 7 hari sebelum diberi beban berat.	Kontraktor		√	
			• Lakukan koordinasi lapangan (site koordinasi) yang baik, dan buat area lay down (penyimpanan material) sementara yang rapi agar tidak mengganggu akses warga sekitar				
			• Wajib menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker debu dan kaca mata pelindung (safety goggles).				
		• Pekerjaan Ukiran Kayu	• Waktu Pelaksanaan	For Info		√	
4	Administrasi	• Joint Inspection	• Belum ada pengajuan Berita acara Joint Inspection	Kontraktor		√	

DOKUMENTASI PROGRESS



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
JALAN BELITON NOMOR 2 DENPASAR – (80112), TELEPON (0361) 222883.
Laman : dispuprkim.baliprov.go.id, Pos-el : puprkim@baliprov.go.id

PT. MANIK SEKECAP KARYA

DOKUMENTASI PROGRESS

(CATUR LOKA PALA)

PT. MANIK SEKECAP KARYA

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
JALAN BELITON NOMOR 2 DENPASAR – (80112), TELEPON (0361) 222883,
Laman : dispuprkim.baliprov.go.id, Pos-el : puprkim@baliprov.go.id

MSK
PT. MANIK SEKECAP KARYA

DOKUMENTASI PROGRESS DI PURA GELAP














PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
JALAN BELITON NOMOR 2 DENPASAR – (80112), TELEPON (0361) 222883,
Laman : dispuprkim.baliprov.go.id, Pos-el : puprkim@baliprov.go.id

PT. MANIK SEKECAP KARYA

DOKUMENTASI PROGRESS DI PURA BATU MADEG

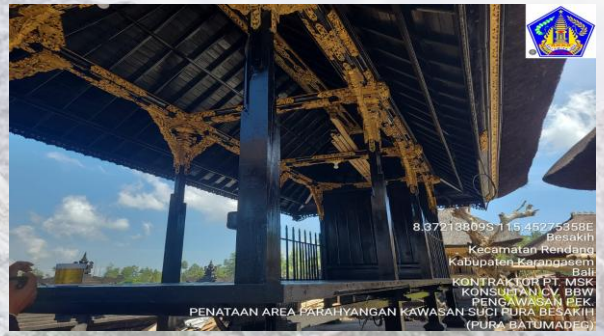











PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
JALAN BELITON NOMOR 2 DENPASAR – (80112), TELEPON (0361) 222883,
Laman : dispuprkim.baliprov.go.id, Pos-el : puprkim@baliprov.go.id

MSK
PT. MANIK SEKECAP KARYA

DOKUMENTASI PROGRESS DI PURA ULUN KUL – KUL













PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
JALAN BELITON NOMOR 2 DENPASAR – (80112), TELEPON (0361) 222883,
Laman : dispuprkim.baliprov.go.id, Pos-el : puprkim@baliprov.go.id

PT. MANIK SEKECAP KARYA

DOKUMENTASI PROGRESS DI PURA KIDULING KRETEG











